


SOCIETA' BENI IMMOBILI TORINESE S.B.I.T. s.r.l.

Stabile in Torino, Via Piave 3

Cronoprogramma - Allegato E

aggiornamento 20/03/2021

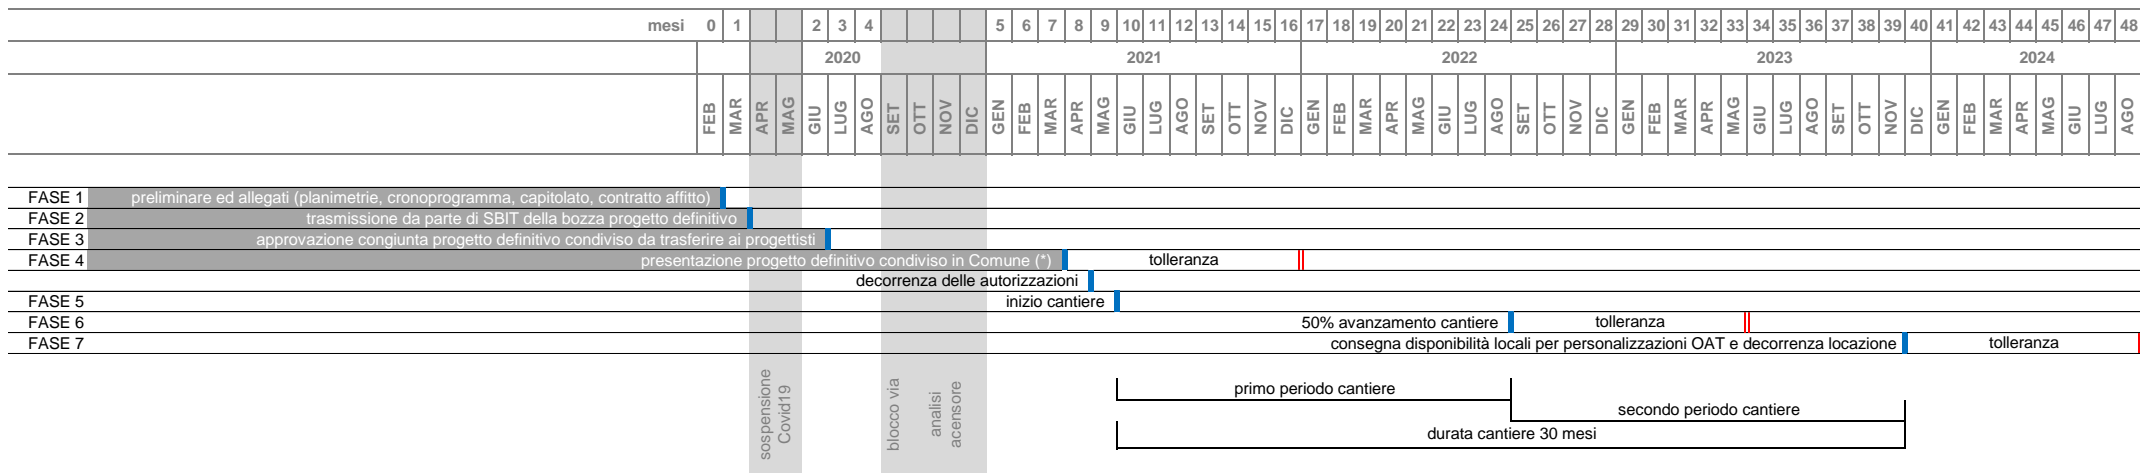

LEGENDA

- tempo massimo previsto per le diverse fasi
- viene mantenuto il lasso temporale rappresentato, a partire dalla conclusione della fase precedente
- tempo minimo di 30 giorni nel caso della decorrenza delle autorizzazioni
- possibilità per OAT di rinunciare senza penali, se tempi non rispettati
- e per SBIT di mantenere il contratto pagando penale
- fasi concluse nei tempi stabiliti

possibili penali SBIT: totale 63500€:

- scaduta la tolleranza 1: 21000€

- scaduta la tolleranza 2: 21000€

- scaduta la tolleranza 3: 21500€

il pagamento da parte di SBIT di una penale riallinea il cronoprogramma al progresso effettivo del cantiere

Slittamenti del cronoprogramma rispetto all'aggiornamento 16/05/2020 (nostra lettera del 12/10/20, vostra dell'11/01/21)	gg
2set20-23set20: interruzione per blocco via Piave	22
12ott20-11gen21: interruzione in attesa di decisione OAT su ascensore	92
	114

(*) in seguito allo slittamento di 114 giorni, il termine per la presentazione in Comune è risultato posticipato al 24/03/2021
